

阳新县老城区雨污分流一期工程（截污干管） 项目绩效评价报告

评价对象：阳新县老城区雨污分流一期工程（截污干管）项目

实施单位：阳新县市政工程有限公司

主管部门：阳新县住房和城乡建设局

委托单位：阳新县财政局

评价机构：湖北诚智财务咨询有限公司

前 言

根据财政部财预〔2020〕10号关于印发《项目支出绩效评价管理办法》、《阳新县人民政府办公室关于进一步加强全县预算绩效管理工作的通知》（阳政办发【2013】112号）和《阳新县县级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（阳财绩【2015】2号）文件要求，为规范财政专项资金的管理，强化项目单位的绩效和责任意识，切实提高专项资金的使用效益，根据阳新县财政局绩效评价工作的通知，湖北诚智财务咨询有限公司（下面简称“诚智财务”）受阳新县财政局委托，本着独立、客观、公正的原则，对“阳新县老城区雨污分流一期工程（截污干管）项目”（下面简称“老城区雨污分流一期项目”）预算执行实施质量和成果及资金使用管理效益实施进行绩效评价。

诚智财务在数据分析、问卷调查、访谈、座谈等工作的基础上形成绩效评价报告。本评价报告先介绍项目基本情况、绩效总目标和评价思路，再分别从项目决策、项目管理和项目产出、可持续五个方面具体分析支出绩效情况，发现亮点、找出问题、形成绩效评价报告，为部门职责履行、职能实现和后续管理提供参考和借鉴进行绩效评价。评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。

目 录

一、项目基本情况	4
（一）项目立项背景	4
（二）项目单位情况	5
（三）项目立项依据	6
（四）项目绩效目标	6
（五）项目建设规模和主要内容	7
二、绩效评估组织实施情况	8
（一）评价的基本目的	8
（二）评价的方法与原则	9
三、项目绩效评价分析	11
（一）项目决策评价分析	12
（二）项目过程评价分析	14
（三）项目产出情况分析	19
（四）项目效益情况分析	25
（五）能力建设及可持续影响分析	27
四、项目存在的问题	29
五、下一步改进措施	29
六、项目评价结论	30
七、其他	31

阳新县老城区雨污分流一期工程（截污干管）

项目绩效评价报告

诚智绩评后【2022】第Q08003号

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

1、目前现状

城市黑臭水体是老百姓反映强烈的水环境问题，原排水系统老化，管道堵塞，汛期排水不畅，雨水倒灌等现象层出不穷，不但损害城市人居环境，也严重影响城市形象，加上地下管网老化，排水不便，经常会出现污水翻涌的现象，污水随处排放，严重污染城市湖泊、富河支流和长江流域。

雨污分流是完善城市基础建设、解决城市防洪内涝、消除黑臭水体的治本之策，而雨污分流是用相互独立的管网系统分别收集雨水和污水，雨水排入周边管道，污水送到市政污水处理厂，从源头控制住了污染，加快污水收集率，提高污水处理率，避免污水对河道、地下水造成污染。

2、立项必要性

阳新县老城区雨污分流改造一期工程（截污干管工程）主要目的是解决污水得不到有效收集而直排入湖的问题，通过整改减少污水直接进入周边水体的污染物质，有效改善水环境质量，改造老城区城市排水规划，不仅能提高污水的有效收集率，更能从源头上加强对城市水体的保护。

（二）项目单位情况

1、项目管理单位情况

老城区雨污分流一期项目由阳新县住房和城乡建设局牵头，阳新县住房和城乡建设局的主要职责是：负责全县城市建设；指导全县村镇建设；承担全县工程建设的标准化、建设质量、安全监督管理的责任；管理全县建筑市场、承担规范市场各方主体行为的责任；承担推进全县建设科技发展、建筑节能和城镇减排的责任；管理和规范全县房地产市场秩序；管理和监督全县人民防空行政执法等工作。

2、项目执行单位基本情况

老城区雨污分流一期项目通过政府采购招投标平台确定技术实力和管理能力较强的施工单位，确保项目按期竣工达标，项目由阳新市政工程公司承接。

阳新县市政工程公司于 1991 年 11 月 22 日成立。法定代表人柯俊，公司经营范围包括：园林绿化；房屋租赁；高度 50 米以下的工业、民用建筑工程；高度 70 米以下的构筑物工程；建筑面积 1.2 万平方米以下的单位工业、民用建筑工程；单跨跨度 27 米以下的建筑工程；各类城市道路；单跨 45 米以下的城市桥梁；15 万吨/日以下的供水工程；10 万吨/日以下的污水处理工程；25 万吨/日以下的给水泵站、15 万吨/日以下的污水泵站、雨水泵站；各类给排水及中水管道工程；中压以下燃气管道、调压站；供热面积 150 万平方米以下热力工程和各类热力管道工程；各类城市生活垃圾处理工程；各类城市广场、地面停车场硬质铺装；单项合同额 4000 万元以下的市

政综合工程；非开挖管道工程施工；建筑装饰装饰工程；地基基础工程、钢结构工程等

（三）项目立项依据

1、根据中央《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规。

2、《阳新县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》第五章提到“老城区改造优化以交通、管网为重点的市政公用设施，同步推进环境卫生设施提级扩能，不断完善和提升老城区的中心服务功能，引导城市品质提升，打造传统特色生活老城。

3、武汉笋江环保科技有限责任公司编制的《阳新县老城区雨污分流改造及一期工程（截污干管）项目环境影响报告表》

4、2021年6月24黄石市生态环境局阳新分局《关于阳新县住房和城乡建设局阳新县老城区雨污分流改及一期工程（截污干管）项目环境影响报告表的批复》阳环函[2021]48号。

（四）项目绩效目标

1、随着城市人口增涨，现有城市小区雨污水管网设施已无法满足新时代的要求，为避免污水对河道、地下水造成污染，便于雨水收集利用和集中管理排放。

2、从2020年9月开始，用近二年时间完成阳新县城区西截污干管、大桥头段、东截污干管、恩波堤段、锦富路段、兴国大道雨水管段、老一中后门段7个区域雨污分流、截污工程。工资总投资

约为 1.43 亿元，总工期 550 日历天。

（五）项目建设规模和主要建设内容

1、主要建设规模

（1）截污干管

西截污干管：北起东坡路、沿西线经燕子口至兴国大道大桥头，总长度 5.161 公里，压力管 575m，配套建设 4 座调蓄池，配套建设两座污水提升泵站，1#污水提升泵站规模 158L/s，2#污水提升泵站规模 256L/s；东截污干管：①在明月湾西北角建设 1#一体化污水处理设备，并配套建设 D600-D700 污水管，总长 230 米。②在明月湾西侧空地上建设 2#一体化污水处理设备，并配套建设 600*600 排水沟，总长 482 米。③在明月湾西侧道路上每隔 200 米建设一段雨水管，将片区雨水排至莲花湖。

（2）恩坡堤街合流管出口改造

新建一处污水提升泵站，3#污水提升泵站规模 5L/s，提升污水至莲花湖大道西侧现状污水井，配套建设 1 座雨水调蓄池。

（3）锦富路合流管出口改造

将莲花湖大道现状合流井改为截流井，以结合井下游为起点，由东向西敷设 DN600mm 污水管 181m。将污水截流至锦富路西段现状合流管中。

（4）湖滨路污水干管（余家湾路至环湖西路）

完善湖滨路污水管网系统，自白杨安置点污水提升泵站至环湖西路，新建 DN600 污水管，长度 540m。

（6）兴国大道（东坡路至图书馆）雨水管网

在兴国大道西侧新增一条 D1000 雨水管，长度 753m,与下游现状 D1500 雨水管相接。

（7）兴国大道（桥头至污水处理厂）污水管

由于改段近期要建设公园，为避免地面反复开挖，先预埋 DN1200 污水干管，长度 611m，接至污水处理厂。

2、项目建设完成状况

截止 2022 年底，阳新县老城区雨污分流一期工程（截污干管）项目共铺设污水管网 8932.8 米、蓄水池 4 座，一体化泵站 3 座，蓄水池绿化植被 1740 平方米，蓄水池机电设备工程一批。

二、绩效评估组织实施情况

（一）评价的基本目的

1、通过对老城区雨污分流一期项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。

2、促使项目评价单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

3、根据上述要求，本次针对项目绩效评价目的有以下几项：

（1）对项目立项、决策情况进行审核，了解项目的立项程序、

政策依据、绩效目标设置等情况，规范项目单位申请立项、决策程序的规范性。

（2）对项目实施过程进行监管复核，了解项目在实施过程中程序是否合规、内控制度是否有效、偏差能否得到有效的纠正。

（3）全面评估项目产出和项目效益，了解项目是否达到预期效果、完成质量是否达标、绩效目标是否实现，从而提高资金管理效率和项目效益。

（4）通过对实施部门及受益对象的调研，及时发现项目实施存在的问题，针对问题提出改进意见，不断提升项目质量和效益，提升服务能力，使政府购买服务效益不断得到提升。

（5）本次绩效评价结果将为财政部门后续项目资金的安排和拨付提供科学的指导，提高政府财政预算和管理能力。

（6）按照项目决策、项目管理、项目产出、项目效益、能力建设五类指标，对项目资金从投入到支出过程及项目效果进行综合分析及评价，从资金使用的合理性、科学性和有效性出发，分析项目存在的问题和影响效果的关键因素，提出建立健全项目管理及资金管理相关制度规定，针对现场评价过程中发现的问题提出建议。

（二）评价的方法与原则

1、前期准备

为保障本次工作的顺利开展，绩效评价工作组共 8 人次去项目管理方阳新县住房和城乡建设局及施工单位阳新县市政工程公司，对有关老城区雨污分流一期（截污干管）项目进行咨询和座谈，并

成立由法人担任项目指导，注册会计师、注册税务师、会计师担任项目经理和项目组负责人，抽调专人成立绩效评价组，明确各自工作职责，制定了现场评价方案，设计相关表格，联系相关部门和单位，确定实施时间，老城区雨污分流一期（截污干管）项目第三方评价小组成员名单如下：

姓名	单 位	职 称 或 职 务
胡晓平	湖北诚智财务咨询有限公司	会计师/项目负责人
张荣华	湖北诚智财务咨询有限公司	注册税务师/项目经理
石成林	湖北诚智财务咨询有限公司	会计师/项目负责人
赵瑶	湖北诚智财务咨询有限公司	审计助理、数据收集与整理

2、实施情况。项目绩效评价实施步骤：

（1）2022年9月14日至10月16日与项目主管单位、实施单位、项目实施科室负责人等召开座谈会，听取该项目有关情况介绍；

（2）收集项目相关政策制度文件、资金拨付明细、项目申报、评审、实施、验收等资料；核查相关制度是否完善，项目申报、评审、审批、实施、验收等程序是否合规，资金拨付手续是否齐全、是否存在截留、挪用等情况；

（3）现场查看。深入实地查看，通过调查走访，发放问卷调查满意度；

（4）形成评价报告。通过对相关资料进行综合分析，按照确定的评价指标和标准，结合现场评价情况，得出评价结论，形成绩效评价报告；

（5）评价原则。严格遵循客观公正、科学合理、绩效导向的原则，评价人员与被评价单位无任何利益关系，评价内容客观公正、标准统一、数据可靠，评价过程不受被评价单位干扰，评价结果依法公开并接受监督；按定量和定性数据中考虑多维因素的影响；并严格执行规定的评价程序，对项目财政资金支出的经济性、效率性和有效性原则进行综合评价；以方法多元、数据多源、过程严谨、多方论证为科学评价的基本保障；资料审查和外围调查相结合，评价结果清晰反映支出和绩效之间的紧密相关关系。资金支出结构与动态同项目具体执行过程与结果作关联分析。

三、项目绩效评价分析

（一）项目决策评价分析

该类指标包括目标内容合理性、政策依据合理性、决策程序适当性、分配办法适用性、分配结果合理性等六个三级指标，主要考察预算单位项目立项的规范性与可行性，绩效目标制定的完整性、科学性与可衡量性。满分 15.00 分，评价得分 13.50 分，得分率为 90.00%。

表 4-1 项目决策类指标具体分值及得分情况

一级指标	二级指标	满分值	评价得分	得分率
项目决策	项目立项	9	7.5	83.33%
	绩效目标	6	6	100.00%
合计		15	13.5	90.00%

1、项目立项分析

(1) 战略目标适应性（满分 3 分）

老城区雨污分流一期（截污干管）项目主要是考核项目是否能够支持部门目标的实现（1分），与部门长期规划目标、年度工作目标是否一致（1分）；是否符合发展政策和优先发展重点（1分）；

阳新县住房和城乡建设局作为负责全县城市、村镇建设的责任单位，承担全县工程建设标准化、推进全县建筑节能和城镇节能减排的责任，项目符合部门工作职责范围和；“环境就是民生，青山就是美丽，蓝天也是幸福。”拥有天蓝、地绿、水净的美好家园，是每个中国人的梦想。习近平十分重视生态环境保护，本次污水处理项目作为环境保护的重点民生工程，在 2018 年开始规划，符合我县优先发展重点规划项目。

经评价，项目符合部门职责和符合我县发展重点项目，得 3 分。

(2) 项目立项依据充分性（满分 3 分）

该项主要考核是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，立项是否经过调研论证、是否经过集体决策、立项依据及申报材料是否充分（3分）；较充分（2分）；一般（1分）；用以反映和考核项目立项依据情况

根据《关于老城区雨污分流一期工程（截污干管）批复》(阳发改审批[2020]203号)、黄石市生态环境局阳新分局阳环函[2021]48号文（阳新县住房和城乡建设局委托“武汉笋江环保科技有限责任公司”编制的《阳新县老城区雨污分流改造及一期工程（截污干管）

项目环境影响报告表》基础上批复项目立项，按照批复的初步设计和投资概算实施项目建设。

经评价，项目立项、资金申报文件及批复均符合要求，依据充分，得 3 分。

(3) 立项程序规范性（满分 3 分）

立项程序规范性考核项目申请、设立过程是否符合相关要求用以反映和考核项目立项的规范情况。

项目从环评、可行性研究报告、初步设计、选址规划、用地审查、招标、投标、中标等各个环节均依法定程序办理，但黄石市生态环境局阳新分局阳环函[2021]48 号文的批复时间为 2021 年 6 月 24 日，而合同签订时间为 2020 年 9 月，作为重大环保项目，在环保立项没有批复的情况下就提前操作，不符合程序。

经评价，项目立项程序基本规范，但施工合同日期明显早于环保立项时间，实际得 1.5 分。

2、项目绩效目标分析

(1) 绩效目标的合理性（满分 2 分）

该项指标考核目标设置是否符合国家相关法律法规、本县国民经济发展规划和党委政府决策；是否与项目单位或委托单位职责密切相关；项目是否为促进事业发展所必须；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；该目标设定依据是否充分、目标是否与预算资金匹配、目标是否包含总目标和阶段性目标。

本项目主管单位根据项目相关文件要求及在项目可行性研究报告

告数据基础上，制定了较为具体的绩效目标，目标设置合理、合规，数据设定充分，与预算资金和项目目标相匹配。

经评价，绩效目标设定合理，得 2 分。

(2) 绩效目标的明确性（满分 2 分）

该指标主要考核依据绩效目标设定绩效指标是否清晰、明细、可衡量等用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

项目主管部门根据立项资料为依据，从项目产出、项目效益、可持续性等方面制定了较为详细的指标体系，量化指标也比较具体明确。

经评价，本项目绩效目标明确，实际得 2 分。

(3) 预算编制科学性（满分 2 分）

该指标主要考核项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应反映，考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

老城区雨污分流一期（截污干管）项目绩效编制基本上围绕项目立项概算为根本，以项目预算书、各项采购合同总价及付款条件为依据进行编制，结合项目监理单位、现场管理员和县住建局领导成员意见统筹制定。

经评价，预算编制较科学，本次得 2 分。

(二) 项目过程评价分析

该类指标包括投入管理、项目财务管理和组织实施等三个二级指标和 8 个三级指标，主要考察项目资金的投入和使用管理是否依

规执行、是否有配套的项目管理制度来保证项目实施合规、合理。

满分 20.00 分，评价得分 13.86 分，得分率为 36.28%。

表 4-2 项目过程类指标分值及得分情况

一级指标	二级指标	满分值	评价得分	得分率
项目管理	投入管理	5	3.86	77.14%
	财务管理	10	7	70.00%
	项目实施	5	4	80.00%
合计		20	14.86	74.28%


1、投入管理分析

(1) 资金到位率（满分 3 分）

该指标指实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

本项目资金来源为公共预算拨款，预算数是 13,756.84 万元，实际支付 9,357.40 万元，其中工程款 8515.27 万元，征地补偿费、服务费等等 842.13 万元，明细如下表。

序号	付款项目	金额（万元）	供应商名称
1	施工款	8515.27	阳新县市政工程公司
2	监理费	79.9	湖北阳诚工程监理咨询有限公司
3	勘察费	59.4	阳新县岩土工程勘察测试中心
4	造价咨询费	39.84	湖北诚建工程管理咨询有限公司
5	工程设计费	208	南京市市政设计研究院有限责任公司
6	征地补偿费、青苗费	275.99	各拆迁户
7	普 查	179	
合计		9357.4	此金额未包含主工程款

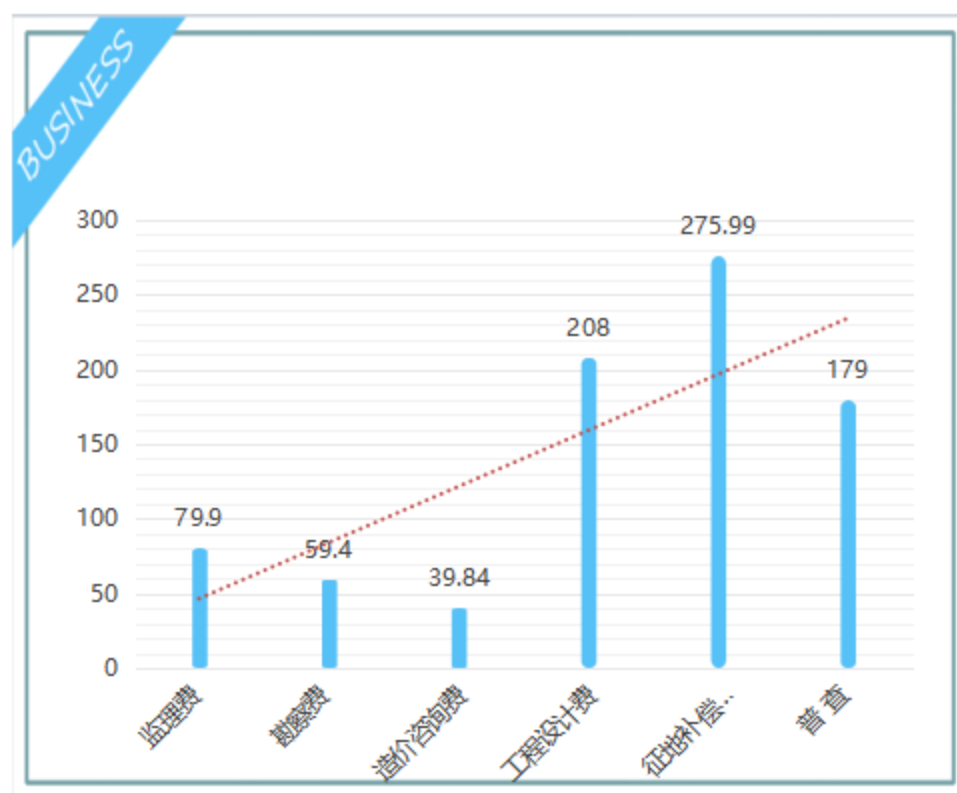

经评价，按资金到位率=实际到位资金/计划到位资金比率实际得 1.86 分（ $8515.27/13756.84 \times 3$ 分）。

(2) 资金使用合理性（满分 2 分）

该指标指项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

项目资金使用符合《关于印发《住建局财务管理制度》的通知》（阳建发[2017]10 号文规定。资金使用纳入地方政府一般公共预算管理；未用于经常性支出；一般债务支出有明确到具体项目，纳入到财政支出预算项目库管理。

资金支出有完整审批程序和手续，符合合同规定的用途。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

经评价，项目资金使用合规，得 2 分。

2、财务管理分析

(1)资金使用合规性（满分2分）

该指标指项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

项目资金使用符合《地方政府专项债务预算管理办法》（财预[2016]155号）规定。资金使用有纳入政府性基金预算管理信息系统；未用于经常性支出；专项债务支出有明确到具体项目，纳入到财政支出预算项目库管理，项目的施工、监理、设计等等均通过政府招标平台，公开、公平、公正选定供应商，确保价格合理，质量合格；各项采购服务均与供应商先签订合同，明确价款、质量、工期、付款条件等。

资金支出有完整有审批程序和手续，符合合同规定的用途。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

经评价，项目资金使用合规，得2分。

(2)管理制度健全性（满分2分）

项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以评价要点反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

经查，项目主管方阳新县住房和建设局有本单位的财务管理制度，但制度只是针对本单位的日常开支管理规定，无针对项目的规定和要求。

经评价，项目实施管理较健全，但未看到相关项目管理规定，适当扣1分，实际得1分。

（3）会计信息审计结果（满分 3 分）

项目实施过程或完成后有审计部门结论，或有上级部门、第三方监督机构的监督结论或审计报告，以考察项目会计信息的合规性、准确性、完整性、及时性。

老城区雨污分流一期（截污干管）项目实施过程中未见审计部门、审计机构、项目主管部门、管理部门上级单位对实施单位项目实施过程的监督记录或专业审计报告，但了解县城市建设管理在专题专议上有讨论项目重要事项并作出解决意见，只是未形成会议纪要。

经评价，项目主管部门虽然有对项目进行监控，但会计信息审计结果无书面资料，适当扣 1 分，实际得 2 分。

（4）实施单位监控措施（满分 3 分）

项目实施单位是否符合相关管理规定来实施和管理项目，以反映和考核所制定专业项目相关管理制度的有效执行情况。

项目实施单位在项目建设过程中，无对实施项目的监督统计报表，但项目主管方有在本项目指挥部派出现场管理人员，负责联络、协调和处理项目建设过程的相关事宜，健全完善了一周一次协调会、一周一次现场督办、一周一次通报等工作机制。

经评价，项目实施单位与项目主管单位有一定的协调机制，但希望能提供或者形成纪要或者督办处理事项的电子档信息，以便于了解和追踪事项的处理结果，本项适当扣 1 分，实际得 2 分。

3、组织实施分析

(1)项目制度健全性（满分 2 分）

项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

经查，老城区雨污分流一期项目主管方无针对重大项目的项目制度管理办法，实施单位也只是在日常同主管单位进行口头沟通，无专业项目规章制度。

经评价，项目管理不能只停留在口头上的，需完善和制定专业项目管理制度，适当扣 1 分，实际得 1 分。

(2)制度执行有效性（满分 3 分）

项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度有效执行情况。

经查，项目实施单位有严格执行各项管理制度，每笔项目支出都有完备的审批手续，单据附件齐全，项目的记账凭证、采购合同、竣工及质量验收报告等资料均有归类存档，项目的每一笔收支业务都在阳新县“财政一体化系统”记账，保证项目资金专款专用和整个项目资金收支可追溯。

经评价，项目执行有按项目制度执行，实际得 3 分。

（三）项目产出情况分析

该类指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等四个二级指标和十五个三级指标，主要考核项目资金使用、工程各项指标完成情况等。该类项目满分 40.00 分，评价得分 36.80 分，得分率为 92.00%。

表 4-3 项目产出类指标具体分值及得分情况

一级指标	二级指标	满分值	评价得分	得分率
项目产出	数量指标	21	19.8	94.29%
	质量指标	4	4	100.00%
	时效指标	9	7	88.89
	成本指标	6	3	100.00%
合计		40	37.80	94.50%

1、数量指标

(1)东截污干管完成率（满分 3 分）

东截污干管建设总长 1.18 公里，其中：在明水湾西北角建设 1#一体化污水处理设备，并配套建设 D600-D700 污水管，总长 230 米，配套建设三座调蓄池；在明月湾西侧空地上建设 2#一体化污水处理设备，并配套建设 600*600 排水沟，总长 482 米；在明月湾西侧道路上每隔 200 米建设一段雨水管理，将片区雨水排至莲花湖。

东截污干管 1.18 公里已经在 2022 年 3 月前如期完工，依据验收相关文件，蓄水池工程及相关机电设备已完工，绿化种植 1740 平方米。

该项目满分 3.00 分，实际得 3 分，得分率为 100%

(2) 西截污干管完成率（满分 3 分）

本截污干管计划北起东坡路、沿西线经燕子口至兴国大道大桥头，总长度 5.161 公里，压力管 575M，0 配套建设 4 座雨水调蓄池，提升泵站规模 158L/S，2#污水提升西北角泵站规模 256L/S。西截污干管受汛期影响，不能水下作业，在合同期内只完成 90%。

该项满分 3 分，按实际完工度 90%计算，实际得 2.7 分（90%*3 分）。

(3) 恩波堤街合流管出口改造（满分 3 分）

恩波堤段在县商务局莲花湖大道对面，通过新建 1 台一体化泵站和 4#调蓄池截流排入莲花湖的污水，加压到恩波堤路原污水管网自流到污水污水处理厂。目前正在进行调蓄池支护施工，预计 2022 年六月份完工。

该项满分 3 分，按实际完工度 90%计算，实际得 2.7 分（90%*3 分）。

(4) 锦富路合流管出口改造（满分 3 分）

锦富路合流管出口改造将莲花湖大道现状合流进改为截流进，以结合井下游为起点，由东向西铺设 N600mm 污水管 181m，封堵过街管涵排水出口，将污水截流到锦富路西段现状合流，依据竣工验收证书已完成验收并投入使用。

该项目满分 3.00 分，评价得分 3.00 分，得分率为 100%。

(5) 湖滨路污水干管（满分 2 分）

湖滨路污水干管(俞家湾路至环湖西路)用 550 米污水管，完善湖

滨路污水管网系统，自白杨安置点污水提升泵站至环湖西路，新建 DN600 污水管，长度 540m，依据竣工验收证书，依据竣工验收证书已完成验收并投入使用。

该项目满分 2.00 分，评价得分 2 分，得分率为 100%。

（6）兴国大道雨水管网（满分 4 分）

兴国大道雨水管网共计分为二段，其中：兴国大道(东坡路至图书馆)雨水管网用 753 米雨水管；兴国大道(桥头至污水处理厂)污水管用 640 米污水管；由于桥头至污水处理厂此施工段施工期也要建设公园，为避免地面反复开挖，先预埋 DN1200 污水干管，长度 611m，接至污水处理厂，依据竣工验收证书，D1000 验收只有 120 米，D1200 验收只有 491 米，与预算有出入。

该项目满分 4.00 分，由于桥头至污水处理厂段未完工，完工率 70%，加之验收数量与预算有一些差异，评价得分 3.4 分（2 分*70%），得分率为 85.00%。

（7）新建泵站污水提升泵站（满分 3 分）

截止 2022 年 10 月底，阳新污水提升泵站新增三座，该项工程建设在 2022 年 3 月前已经完工。

该项目满分 3.00 分，评价得分 3.00 分，得分率为 100%。

总计用各规格雨污水管 2836 米、4 座污水提升泵站、18 座雨水调蓄池。实际完成计划指标 90%，评价得 3 分，得分率为 100%。

2、质量指标

工程项目质量达标率（满分 4 分）

阳新县老城区雨污分流一期工程（截污干管）项目依合同约定，执行现行国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准以及相应的规章等。

为保证工程质量、工期和明确责任等，施工合同中承包人承诺按照合同约定施工、竣工，在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行合同所约定的全部义务。项目施工过程中未出现质量事故。

项目完工后，施工单位及时在兴国镇组织下，对截污干管项目开展质量安全巡查和监督。由县政府、住建局等相关部门及时进行验收，验收内容包括任务完成情况，工程质量档案建立情况，配套资金使用管理情况等，均验收合格，合格率 100.00%。

该类项目满分 4 分，评价得分 4 分，得分率为 100%。

3、时效指标

（1）项目开工及时率（满分 3 分）

依据阳新县老城区雨污分流一期工程（截污干管）项目工程施工合同，项目于 2020 年 9 月签订，当月即开工。开工及时。

该类项目满分 3 分，评价得分 3 分，得分率为 100%。

（2）项目完工及时率（满分 3 分）

项目工期 540 天，项目实施从 2020 年 9 月起至 2022 年 7 月底共 650 多天，超过预期 100 多天，项目开展进度较慢。

该类项目满分 3 分，评价得分 2 分，得分率为 66.67%。

（2）项目完成验收及时性（满分 3 分）

本项目工程完工后，项目施工方依合同约定及时组织项目主管方阳新县住房和城乡建设局、项目设计方南京市市政设计研究院有限责任公司湖北分公司、项目勘察方阳新县岩土工程勘察测试中心、项目监理方湖北阳诚工程监理咨询有限公司共同组织验收，保证验收的公证、公平和程序合法。

该类项目满分 3 分，得分 3 分，得分率为 100%。

4、成本指标

(1) 经济成本（满分 3 分）

老城区雨污分流一期工程（截污干管）项目采取公开招投标方式控制采购成本，按照财务管理制度控制费用支出及核算成本，措施有效，投资成本从预期的 14979.75 万元，通过合理谈判，工程中标价 13756.85 万元，成本下降 1223 万元。

该类项目满分 3 分，得分 3 分，得分率为 100%。

(2) 社会成本（满分 2 分）

容易造成污水外溢，造成环境污染，严重影响城市风貌和社区形象。雨污分流实施以后，减少了污水对水体的影响。避免了对河道明渠等造成污染，不仅改善了居民的生活环境，同时提升了城市的形象水平，未造成社会成本增加。

该类项目满分 2 分，得分 2 分，得分率为 100%。

(3) 生态环境成本（满分 2 分）

项目施工时期无法避免会破坏部分绿化土地等，造成了少量的生态损失，但施工单位基本恢复了部分绿化植被，通过施工绿化植

被正在逐步恢复，只有极大改变项目地及周边的生态环境，而不会产生负面影响。

该类项目满分 2 分，得分 2 分，得分率为 100%。

（四）项目效益情况分析

该类指标包括经济指标、社会效益指标、生态效益指标、等三个二级指标共五个三级指标，反映对当地建筑材料和建筑服务业的带动作用、解决城区雨污分流问题、改善周边水环境质量的生态效益、推进环境卫生设施提级扩能、改善附近居民的生活环境等增加等社会效益的、生态效益和可持续性影响情况及收益群众的满意程度。该类项目满分 15.00 分，评价得分 14.00 分，得分率为 93.33%。

表 4-4 项目产出类指标分值及得分情况

一级指标	二级指标	满分值	评价得分	得分率
项目效益	经济指标	3	2	66.67%
	社会效益指标	6	6	100.00%
	生态效益指标	6	6	100%
合计		15	14	93.33%

1、经济指标分析（满分 3 分）

（1）直接带动建筑材料销售，间接带动建筑服务业发展。

项目施工需要大量的沙、石、钢筋、水泥混凝土、雨污排水管等建筑材料和工程机械设备使用，涉及的材料费、机械费、设备费

和主材费等方面，直接带动当地建筑材料销售，间接带动建筑服务业发展，产生了一定的经济效益

该项评价指标满分 3 分，评价得分 2 分，但是建设期效果不明显，得分率为 66.66%。

2、社会效益指标分析

（1）解决城区雨污分流问题（满分 3 分）

阳新县老城区雨污分流改造及一期工程（截污干管）项目主要为合流制，部分区域的周边小区、民房和餐饮商铺等私自将污水接入雨水管道。老城区排水系统的排口位于莲花湖边，由于片区内雨污分流不彻底，排口混流排入莲花湖内。

本项目实施后，将有效解决城区雨污分流问题，仅雨水排入莲花湖，污水分流加压到截污干管网进入污水处理厂，减少污水对天然水体的污染，是一项功在当下、惠及长远的民生工程 and 民心工程。

该项评价指标满分 3 分，评价得分 3 分，得分率为 100%。

（2）带动居民就业（满分 3 分）

本项目属于基础设施建设，是劳动和资金密集型产业，上游产业带动能力很强，建设过程中需大量的产业工人，尤其是农民工，增加大量的就业机会，缓解当地农民劳动力富余的矛盾，提高农民收入，改善农民的生活质量，调节社会收入再分配，这也是社会和谐发展的一个重要方面。

该项评价指标满分 3 分，评价得分 3 分，得分率为 100.00%。

3、生态效益指标

（1）改善附近居民的生活环境（满分 2 分）

老城区环境得到改善，不再出现排口周边水域呈现令人不悦的颜色和散发令人不适的气味，给人们带来了较好的感官体验，改善了周边居民的生产生活环境，推进区域的整体发展，彻底改善了市民的居住环境，为推进美丽城市建设奠定了坚实基础。

该项评价指标满分 2 分，评价得 2 分，得分率为 100%。

（2）推进城市建设，提高城市形象（满分 2 分）

城市污水管等建设，有效的改善了老城区的污水分流问题，提高了城市形象。但是建设期不太明显，也给居民带来了较大的便利。

该项评价指标满分 2 分，评价得分 2 分，得分率为 100.00%。

（五）能力建设及可持续影响分析

该类指标包括可持续影响指标、满意度指标二个二级指标和 4 个三级指标，反映项目后期管护的可持续性影响情况及收益群众的满意程度影响情况，该类项目满分 10 分，得 10 分，得分率为 100%。

表 4-5 项目能力建设及可持续影响指标分值及得分情况

一级指标	二级指标	满分值	评价得分	得分率
项目效益	可持续影响指标	7	7	100%
	满意度指标	3	3	100%
合计		10	10	100%

1、可持续影响分析

（1）长效机制建设（满分 3 分）

考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，项目后期管护情况。

根据《中华人民共和国环境保护法》第六条 地方各级人民政府应当对本行政区域的环境质量负责。

项目建成后将移交专门的政府专业职能管理机构，可保证项目的长期运行和养护，

项目建成后将移交专门的管理机构，需做好后期维护；建立相关应急预案机制，及时解决突发事件。项目实施后，需加强水体检测，持续改善。

该类项目满分 3 分，评价得分 3 分，得分率为 100%。

（2）人力资源对项目可持续影响（满分 3 分）

政府专业职能管理机构有明确的分工，并配备有专业管护人员，并安排相关管理经费用于项目后期养护，并通过招投标方式对道路绿化进行养护，检查项目地污水处理品质，可以保证项目的人力资源保持可持续保证。

该类项目满分 3 分，评价得分 3 分，得分率为 100%

（3）硬件条件对项目发展作用（满分 3 分）

地方环境保护部门有养护需要专业的设备来运作和质量保证，作为政府管理职能部门，本身就配置有专业的配套机器设备或可以调配到各种专业设备，建立相关应急预案机制，及时解决突发事件。

该类项目满分 3 分，评价得分 3 分，得分率为 100%

2、满意度指标

受益群众满意度（满分 3 分）

现场工作人员对项目的了解、雨污分流改善效果、改善周边水环境质量、推进环境卫生设施提级扩能、项目整体满意度及项目实施后期管护满意度等情况满意度达到 92%以上。

该类项目满分 3 分，评价得分 3 分，得分率为 100%。

四、项目存在的问题

1、没有项目专业管理制度，不便于针对特定项目的规范管理，办事效率得不到提高。尤其是监理单位，没有明确规定。

2、实际完工时间晚于合同签订时间，程序不到位，可能出现责任不清、预算控制不力等情况。

3、项目主管方对重要重大民生工程要加大监督力度，对日常监督要有会议纪要、图片、表格，以便于跟踪事后进度及处理结果。

4、项目合同签定期 2020 年 9 月，项目环保批复在 2021 年 6 月 24 日，程序不合法。

五、下一步改进措施

1、应建立切实有效的业务管理制度，提高办事效率，增加业务透明度，同时提高相关业务能力。

2、做好现在及将来污水管质量检查，定量定性分析，持续改善。

3、建立切实有效的项目业务监督管理制度，提高办事效率，增加业务透明度。


4、应安排专人对接项目，负责项目相关资料的收集和管理，做

好随时备查的准备。

5、涉及金额较大的工程，建设主管部门要定期对施工过程进行监督，或者请专业第三方审计单位、审计局对项目进行审核监督。

六、项目评价结论

1、按照财政专项资金绩效评价工作统一要求，结合该项目实际情况，本次绩效评价一级指标包括项目决策、项目过程、产出指标、效益指标、能力建设 5 个方面，权重分别如下图：

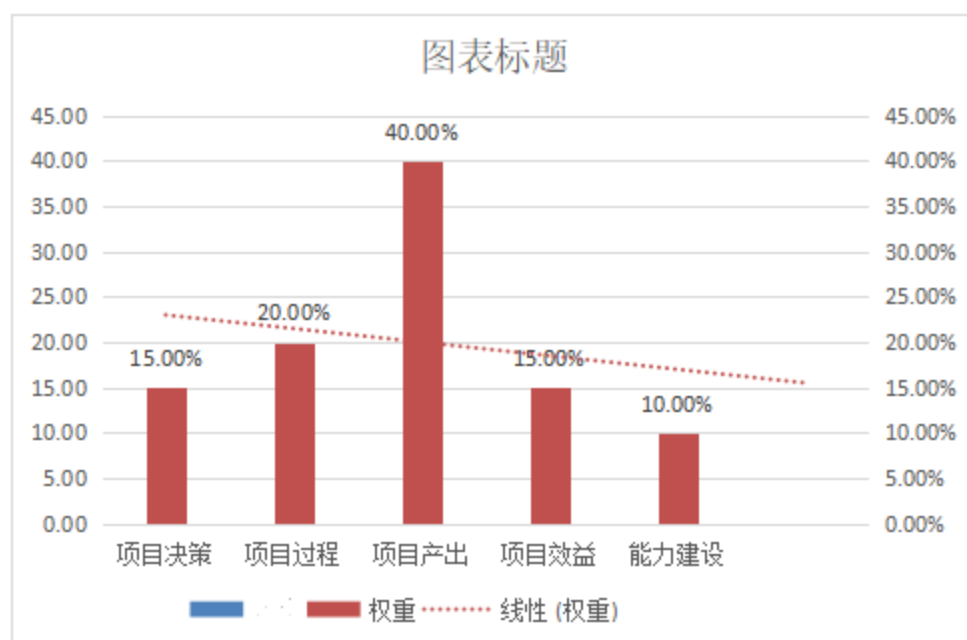

其中：项目决策指标下设二个二级指标；项目过程指标下设三个二级指标；产出指标下设四个二级指标；效益指标下设三个二级指标；能力建设下设二个二级指标，二级指标下设若干三级指标，共 38 个。

2、评价结果划分为四个等级，满分为 100，分别为：60 分以下级别为“差”；60-80 分级别为“一般”；80-90 分级别为“良”； ≥ 90 分级别为“优”，2022 年度阳新县老城区雨污分流一期工程

（截污干管）项目绩效评价得 90.16 分，评价等级为优，建议予以继续支持项目建设。

3、本次评价采取目标比较法、因素分析法、现场考察法等评价方法，通过专家书面评价和现场查看，围绕项目管理、项目立项合规性、项目绩效、项目可持续性等方面评审与核实，认为该项目立项政策依据充分，程序规范，能够反映项目实施带来的产出及效益，评价人员认为 2022 年度阳新县老城区雨污分流一期工程（截污干管）项目实施和资金执行绩效复核评价工作从规划、立项到项目落地实施，取得了一定的成绩，项目总体实施情况良好，达到了预期的绩效目标，但也存在绩效指标不明确、完整，监督管理工作还需加强完善等问题，该项目综合评价得分。

七、其他

本报告专为委托方为本报告所列明的目的以及报送有关部门，绩效评价报告书的使用权归委托方所有，除依据法律规定需要公开的情形外，报告的全部或部分内容不得见诸于媒体。

湖北诚智财务咨询有限公司

2022 年 10 月 14 日

雨污分流预收款

序号	时间	凭证号	摘要	金额	汇款方	收款账户
1	2021.1.27	43	雨污分流工程款	20,000,000.00	工行广场支行	
2	2021.5.28	8	雨污分流工程款	8,000,000.00	工行广场支行	
3	2021.6.30	7	雨污分流工程款	20,000,000.00	工行广场支行	
4	2021.8	42	雨污分流工程款	8,000,000.00	工行广场支行	
5	2021.10.25	30	雨污分流工程款	7,000,000.00	工行广场支行	
6	2021.11.25	2	雨污分流工程款	7,060,000.00	工行广场支行	
7	2021.12.16	14	雨污分流工程款	4,000,000.00	工行广场支行	
8	2022.1.26	50	雨污分流工程款	10,000,000.00	工行广场支行	
9	2022.8.24	67	雨污分流工程款	1,092,755.00	中行阳新支行	
合计：				85,152,755.00		

阳新县自然资源和规划局

阳新县自然资源和规划局 关于阳新县老城区雨污分流改造一期工程 （截污干管）建设用地审查意见的复函

县住房和城乡建设局：

你单位送达的《关于出具“阳新县老城区雨污分流改造一期工程（截污干管）”土地预审意见的函》已收悉，根据国土资源管理相关政策规定，我局对该项目用地进行了初步审查，意见如下：

一、该项目用地符合国家产业政策和供地政策，同意该项目按程序用地。

二、该项目拟选址在阳新县城区范围内，涉及兴国镇、经济开发区和城东新区。规划新建污水提升泵站四座，污水重力流管道 100.521 公里和压力管道 0.713 公里。用地选址位置应符合阳新县土地利用总体规划要求，确需在规划允许建设区外选址的，应按照规定调整修改的有关规定，先行调整修改规划。

三、你单位应从严核定项目建设用地规模，项目开工建设前，要做好土地权属的调处工作，并根据国土资源管理有关要求办理相关土地手续，同时要做好地质灾害防治及安全生产工作。

阳新县自然资源和规划局

2019 年 4 月 9 日

阳新县自然资源和规划局

关于阳新县老城区雨污分流改造一期工程 （截污干管）”的初步选址意见

阳新县住房与城乡建设局：

你局《关于出具“阳新县老城区雨污分流改造一期工程（截污干管）”初步选址意见书的函》已收悉，现回复如下：

原则同意你局开展的“阳新县老城区雨污分流改造一期工程（截污干管）”在阳新县老城区莲花湖沿岸及北湖、南门河沿岸选址，主要工程内容包括：

（1）截污干管

西截污干管：北起东坡路、沿西线经燕子口至兴国大道大桥头，总长度 5.99 公里，压力管 558m，配套建设 14 座雨水调蓄池。
东截污干管：北起湖滨路，南至莲花湖大道，总长度 1.18 公里，压力管 138m，配套建设 3 座雨水调蓄池。

（2）污水提升泵站

截污干管配套建设三座污水提升泵站，1#污水提升泵站规模 46.70L/s，2#污水提升泵站规模 182.16L/s，3#污水提升泵站规模 34.85L/s。

（3）恩波堤街合流管出口改造

新建一处污水提升泵站，规模 5L/s，提升污水至莲花湖大道

黄石市生态环境局阳新县分局

阳环函[2021]48号

关于阳新县住房和城乡建设局阳新县老城区雨污分流改造及一期工程（截污干管）项目环境影响报告表的批复

阳新县住房和城乡建设局：

你单位委托武汉笋江环保科技有限责任公司编制的《阳新县住房和城乡建设局阳新县老城区雨污分流改造及一期工程（截污干管）项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）（项目代码：2019-420222-78-01-012792）及报批申请材料收悉。该项目按照环评告知承诺制改革试点要求执行，我局对《报告表》不作实质性审查，直接出具审批意见。根据你单位承诺和《报告表》结论，你单位可按《报告表》所列建设项目性质、规模、地点以及拟采取的生态环境保护措施建设，项目实施相关法律责任由你单位自行承担。

你单位应当全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施，严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，做到各类污染物达标排放。

项目的环境监督检查工作由阳新县生态环境保护综合

执法大队负责。

2021年6月24日

（管干五线）野工限一及散放旅

夏供由泰岩脐印漫製平目更

明》由坤德隆公司负责调查并出具调查报告

限一及散放旅由阳新县生态环境局负责调查并出具调查报告

告旅》由阳新县生态环境局负责调查并出具调查报告

中出层见（147210-10-87-252024-6102，即外置层）（《森

林生态及环境调查报告》由阳新县生态环境局负责调查并出具调查报告

，由阳新县生态环境局负责调查并出具调查报告

《森生态及环境调查报告》由阳新县生态环境局负责调查并出具调查报告

由阳新县生态环境局负责调查并出具调查报告

，由阳新县生态环境局负责调查并出具调查报告

由阳新县生态环境局负责调查并出具调查报告

由阳新县生态环境局负责调查并出具调查报告

由阳新县生态环境局负责调查并出具调查报告

抄送：阳新县生态环境保护综合执法大队、武汉笋江环保科

技有限责任公司

阳新县发展和改革委员会文件

阳发改审批[2019]18号

签发人：钟震宇



阳新县老城区雨污分流改造及一期工程（截污干管）项目

建议书的批复

阳新县住房和城乡建设局：

你单位报来的关于出具《“阳新县老城区雨污分流改造一起工程（截污干管）”项目建议书》的函及相关资料已收悉。本项目的建设将加强阳新县老城区污水收集系统，提高污水收集率及集中处理率，为阳新县建设“生态文明先导区”提供有力的支撑。原则同意该项目建议书。现批复如下：

一、项目名称：阳新县老城区雨污分流改造及一期工程（截污干管）。

项目代码：2019-420222-78-01-012792

二、项目建设地点：阳新县老城区；近期实施范围为莲花湖沿岸及北湖、南门河沿岸。

三、项目建设内容及规模：1、老城区雨污分流改造

雨水工程：新建雨水干管 4.418km，改造雨水干管 16.631km，新建社区雨水支管 41.518km，改造社区雨水支管 2.263km。

污水工程：新建污水重力流管道 100.521km，新建压力管道 0.713km，新建泵站污水提升泵站四座。

2、近期实施内容

（1）截污干管

西截污干管：北起东坡路、沿西线经燕子口至兴国大道大桥头，总长度 5.99 公里，压力管 558m，配套建设 14 座雨水调蓄池。东截污干管：北起湖滨路，南至莲花湖大道，总长度 1.18 公里，压力管 138m，配套建设 3 座雨水调蓄池。

（2）污水提升泵站

截污干管配套建设三座污水提升泵站，1#污水提升泵站规模 46.70L/s，2#污水提升泵站规模 182.16L/s，3#污水提升泵站规模 34.85L/s。

（3）恩波堤街合流管出口改造

新建一处污水提升泵站，规模 5L/s，提升污水至莲花湖大道西侧现状污水井，配套建设 1 座雨水调蓄池。

（4）锦富路合流管出口改造

封堵过街管涵排水出口，新建 DN600mm 污水管，长度 187m，接入锦富路现状合流管。

（5）湖滨路污水干管（俞家湾路至环湖西路）

完善湖滨路污水管网系统，自白杨安置点污水提升泵站至环湖西路，新建 DN600 污水管，长度 550m。

 兴唐大道（东坡路至图书馆）雨水管网
在兴唐大道东侧新增一条 D1000 雨水管，长度 753m，与下游现状 D1000 雨水管相接。

(1) 兴唐大道（桥头至污水处理厂）污水管

由于该段近期要建设公园，为避免地面反复开挖，先预埋 DN1200 污水干管，长度 640m，接至污水处理厂。

四、项目建设工期：2019-2020 年。

五、项目总投资及资金来源：总投资匡算为 81883.61，项目资金为政府资金。

接此批复后，抓紧编制项目可行性研究报告并经专家评审后按项目建设基本程序报我局审批。



阳新县发展和改革局

2019 年 4 月 9 日印发

阳新县发展和改革局文件

阳发改审批[2019]36号

签发人：钟震宇

关于阳新县老城区雨污分流一期工程（截污干管） 项目可行性研究报告的批复

阳新县住房和城乡建设局：

你单位报来的《关于出具阳新县老城区雨污分流一期工程（截污干管）项目可行性研究报告批复的函》及相关资料已收悉。经专家评审及我局研究，原则同意该项目可行性研究报告。现批复如下：

一、项目名称：阳新县老城区雨污分流改造及一期工程（截污干管）。

项目代码：2019-420222-78-01-012792

二、项目建设地点：阳新县老城区，近期实施范围为莲花湖沿岸及北湖、南门河沿岸。

三、项目建设内容及规模：（1）西截污干管：北起东坡路，沿西线经燕子口至兴国大道大桥头，总长度 5.99 公里，压力管 558m，配

套建设 14 座雨水调蓄池。东截污干管：北起湖滨路，南至莲花湖大道，总长度 1.18 公里，压力管 138m，配套建设 3 座雨水调蓄池。

(2) 污水提升泵站

截污干管配套建设三座污水提升泵站，1#污水提升泵站规模 158L/s，2#污水提升泵站规模 256L/s，3#污水提升泵站规模 35L/s。

(3) 恩波堤街合流管出口改造

新建一处污水提升泵站，规模 5L/s，提升污水至莲花湖大道西侧现状污水井，配套建设 1 座雨水调蓄池。

(4) 锦富路合流管出口改造

封堵过街管涵排水出口，新建 DN600mm 污水管，长度 187m，接入锦富路现状合流管。

(5) 湖滨路污水干管（俞家湾路至环湖西路）

完善湖滨路污水管网系统，自白杨安置点污水提升泵站至环湖西路，新建 DN600 污水管，长度 550m。

(6) 兴国大道（东坡路至图书馆）雨水管网

在兴国大道东侧新增一条 D1000 雨水管，长度 753m，与下游现状 D1500 雨水管相接。

(7) 兴国大道（桥头至污水处理厂）污水管

由于该段近期要建设公园，为避免地面反复开挖，先预埋 DN1200 污水干管，长度 640m，接至污水处理厂。

四、项目建设工期：3 年。

五、项目总投资及资金来源：总投资估算为 22647.38 万元，该项目资金为政府资金。

接此批复后，请你单位抓紧编制项目初步设计报告经我局组织专家评审后按项目建设基本程序报我局审批。开工前未办理相关手续的，不得动工建设。

二〇一九年六月二十六日



阳新县发展和改革委员会

2019年6月26日印发

阳发改审批[2020]203 号

签发人：孔祥鹏

关于阳新县老城区雨污分流一期工程（截污干管）
项目初步设计的批复



阳新县住房和城乡建设局：

你单位报来的《关于出具“阳新县老城区雨污分流一期工程（截污干管）”项目初步设计批复的函》及相关资料收悉，经研究，同意该项目初步设计，现批复如下：

一、项目名称：阳新县老城区雨污分流一期工程（截污干管）

项目代码：2019-420222-78-01-012792

二、项目拟建地点：阳新县老城区；近期实施范围为莲花湖沿岸及北湖、南门河沿岸。

三、项目建设规模及主要建设内容：（1）截污干管

西截污干管：北起东坡路、南至兴国大道，总长度 5.161 公里，压力管 575m，配套建设 4 座调蓄池，配套建设两座污水提升泵站，1#污水

提升泵站规模 158L/s，2#污水提升泵站规模 256L/s。

东截污干管：①在明月湾西北角建设 1#一体化污水处理设备，并配套建设 D600—D700 污水管，总长 230 米。②在明月湾西侧空地上建设 2#一体化污水处理设备，并配套建设 600×600 排水沟，总长 482 米。③在明月湾西侧道路上每隔 200 米建设一段雨水管，将片区雨水排至莲花湖。

（2）恩波堤街合流管出口改造

新建一处污水提升泵站，3#污水提升泵站规模 5L/s，提升污水至莲花湖大道西侧现状污水井，配套建设 1 座雨水调蓄池。

（3）锦富路合流管出口改造

将莲花湖大道现状合流井改为截流井，以结合井下游为起点，由东向西敷设 DN600mm 污水管 181m，将污水截流至锦富路西段现状合流管中。

（4）湖滨路污水干管（俞家湾路至环湖西路）

完善湖滨路污水管网系统，自白杨安置点污水提升泵站至环湖西路，新建 DN600 污水管，长度 540m。

（5）兴国大道（东坡路至图书馆）雨水管网

在兴国大道西侧新增一条 D1000 雨水管，长度 753m，与下游现状 D1500 雨水管相接。

（6）兴国大道（桥头至污水处理厂）污水管

由于该段近期要建设公园，为避免地面反复开挖，先预埋 DN1200 污水干管，长度 611m，接至污水处理厂。

四、项目建设工期：36 个月。

五、原则同意该项目的设计方案。

六、项目资金来源：总投资概算为 19033.02 万元，资金来源为专项资金。

七、有关要求：1. 请在开工建设前，务必确保各渠道资金得到落实，否则不能开工建设；务必坚持量力而行，严格遵守中央和省里关于防范风险的各项政策。2. 请严格落实《中共中央办公厅、国务院办公厅关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的通知》、《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发党政机关公务用车配备使用管理办法的通知》，本投资项目不得用于变相和顺道搭车建设办公用房、购置公务用车、办公用品。3. 本次投资请严格按照《中央预算内直接投资项目概算管理暂行办法》（国家发展改革委发改投资〔2015〕482 号）有关要求严格控制概算核定、投资规模，防止超概算现象的发生。

请你单位接此批复后，按相关程序开展报建工作，尽快办理齐备需要开工前取得的要件，抓紧做好工程开工各项准备工作，规范执行项目法人责任制、招投标制、建设监理制和合同管理制，加强基建财务管理，严格控制工程投资。加强项目监管，确保项目安全和质量，并及时向我局如实报送项目开工、建设和竣工验收等进展情况。

附：阳新县老城区雨污分流一期工程（截污干管）项目初步设计投资概算核定表

二〇二〇年五月二十一日

阳新县发展和改革局

2020 年 5 月 21 日印发

阳新县财政局

阳财投[2020]101号

关于阳新县老城区雨污分流改造一期工程（截污干管）预算评审的意见



阳新县住房和城乡建设局：

你单位送审预算：阳新县老城区雨污分流改造一期工程（截污干管），预算14979.75万元。

预算评审意见：阳新县老城区雨污分流改造一期工程（截污干管）预算14481.13万元（详见预算评审报告），比送审预算审减了498.62万元。

本报告仅作为建设单位前期投资控制参考，不作为该项目资金拨付依据和法定结算依据。

（附件：预算评审报告）

二〇二〇年八月五日

函

阳新县公共资源交易监督管理局：

阳新县老城区雨污分流一期工程（截污干管）工程项目，已由阳发改审批[2020]203号文件批准建设，因招标人应坚持投标人投标报价和其履约能力、服务质量等与招标项目相匹配的原则原因，根据阳政办发2018（30号）文《县人民政府办公室印发关于深化招标投标制度改革的实施办法的通知》文件规定，现申请采取评定分离方式进行公开招标。

特此来函，请予批准。


阳新县住房和城乡建设局
2020年8月6日

阳新县人民政府
www.yx.gov.cn

设为首页 加入收藏 繁体

阳新县 阳新县 阳新县 阳新县 阳新县 阳新县 阳新县

阳新县老城区雨污分流一期工程（截污干管）施工招标公告

招标编号: 131-2020GC-72

招标条件

本招标项目阳新县老城区雨污分流一期工程（截污干管）已由阳新县住房和城乡建设局以阳财采备【2020】B107号文批准建设，建设资金并，招标人为阳新县住房和城乡建设局，招标代理机构为湖北中诚工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

项目概况与招标范围

2.1本招标项目的建设地点：阳新县老城区

2.2本招标项目的建设内容：①截污干管②恩波堤街合流管出口改造③棉富巷合流管出口改造④湖滨路污水干管（前家湾路至环湖西路）⑤兴园大道（桥南）雨水管⑥兴园大道（桥头至污水处理厂）污水管等。具体招标内容详见图纸及工程量清单

2.3本招标项目的合同估算价：约14481.13万元。

2.4本招标项目的计划工期：18个月，计划开工日期 2020年9月

2.5本招标项目的招标范围：详见图纸及工程量清单。

2.6本招标项目的标段划分（如果有）：本项目划分为1个标段。

2.7其他：质量目标：达到国家现行工程质量验收合格标准。

投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须具备住房和城乡建设主管部门颁发的有效的市政公用工程施工总承包贰级及以上资质，具备有效的安全生产许可证，具备工程所在地核发的有效企业法人营业执照。投标人在投标截止之日前五年（2015年1月至投标截止之日）至少已完成一个单项施工合同金额8000万元或以类似项目工程（业绩证明材料需提供中标（成交）通知书及施工合同或竣工验收证明），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，拟派项目经理须具备相关主管部门核发的市政专业贰级或贰级以上（不含临时证）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证）其他在施建设工程项目的项目经理；安全员具备安全生产考核证（C证），施工员、质量员（质检员）须具有岗位培训考核合格证书；项目管理主要、劳动合同和社保部门认定的连续一年（2019年1月至投标截止之日前连续一年）社保证明材料（提供网上截图和社保发票）。

3.2本次招标不接受联合体投标。

3.3信誉要求：没有被责令停业；没有被暂停或取消投标资格；财产没有被接管或冻结；在最近三年内没有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题（提供信誉承诺书）。

3.4投标人及其法定代表人和拟派的项目经理近三年（从本项目公告发布之日起往前推36个月）没有行贿犯罪记录（投标人自行提供承诺或提供在“http://wenshu.court.gov.cn/”查询截图）。

3.5根据《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法[2016]285号）规定，须通过“信用中国”（网址：www.creditchina.gov.cn）网站进行信用查询，投标企业若在“失信被执行人”名单中的，其投标无效，查询结果以开标当天在“信用中国”网站查询结果为准；

3.6所有省内、外建筑企业在鄂从事建筑活动，需登录湖北省建筑市场监管和诚信一体化平台，报送企业基本信息和人员信息。以一体化平台信息为准，提供平台信息记录截图并加盖公章，如未提供或查实不符合要求或提供虚假材料的作废标处理。

3.7本次招标采取资格后审方式（合格制），资格审查的具体要求见招标文件，资格审查不合格的投标人投标文件将被否决。

3.8依据《黄石市房屋建筑和市政基础设施工程评定分离的程序与方法（试行）》的通知（黄公共资源局发〔2018〕27号）、《黄石市房屋建筑和市政基础设施工程评定分离工作指导规则（试行）》的通知（黄公共资源局发〔2018〕28号），本项目采用“评定分离”方法实施招标投标活动，有关条款详见招标文件。

4.2办理CA数字证书后,请于2020年8月11日至2020年8月17日17时30分止(北京时间,下同),通过互联网使用CA数字证书登录“阳新县工程平台”(http://yxgcjs.hsztlbx.com/login),根据所投标段,下载招标文件、工程量清单文件、施工图纸等,未按规定下载招标文件的,其

投标文件的递交

5.1投标文件包括纸质投标文件及不加密的电子投标文件(U盘备份)。投标文件递交截止时间为2020年9月3日9时00分。投标人应当在投标截止时间方式递交投标文件:

现场递交:投标人应当在投标截止时间前,将纸质投标文件及不加密的电子投标文件(U盘备份)按照招标文件要求密封和加写标记后,递交至公共资源交易中心一楼开标大厅(阳新县陈家湾安置小区东侧)。逾期送达的或者未送达指定地点的,或者未按招标文件要求密封或者加写标记,招标人将拒收。

发布公告的媒介

本次招标公告同时在黄石公共资源交易信息网、阳新县人民政府网上发布。

联系方式

1.招标人:阳新县住房和城乡建设局

地址:阳新县陵霞大道13号

联系人:黄杰 电话:15972533012

2.招标代理机构:湖北中瑞工程咨询有限公司

地址:阳新县宏康·华仁北郡11栋33楼3308室

联系人:万楠 电话:0714-7398188

3.综合监督机构:政务服务和大数据管理局公共资源交易监督管理股

联系电话:0714-7319782

地址:阳新县市民之家4楼

2021

备注:投标人拟派的项目经理(建造师)(下同)不得同时担任两个及以上建设工程项目的项目经理(项目负责人)。存在下列情形之一的,不得担任建设工程项目的项目经理:(1)同一工程相邻分段发包或分期施工的;(2)合同约定的工程验收合格的;(3)因非承包方原因致使工程停工(含),经建设单位同意的。



关于我们 | 联系我们 | 网站地图 | 使用帮助

阳新县公共资源交易中心主办 阳新县政务服务和大数据管理局承办 阳新县公共资源交易中心 阳新县市民之家四楼

阳新县政务服务热线:420222020000544 阳新县政务服务热线:4202220012 阳新县政务服务热线:4202220012

阳新县住房和城乡建设局

关于阳新县老城区雨污分流一期工程（截污干管）项目进行公开招投标拦标价下浮的函

县公共资源交易中心：

为加强我县生态文明建设，统筹治理老城区周边水环境，推进老城区区生活污水处理设施建设。老城区雨污分流一期工程（截污干管）项目作为县政府重点工程之一，该项目依据《黄石市房屋建筑和市政基础设施工程评定分离的程序与办法》进行施工公开招投标，已经县政府领导研究，请贵局按投标报价低于拦标价 95%以下评审意见为合格实施。



投 标 总 价

投标人: _____

工程名称: 阳新县老城区雨污分流一期工程(截污干管)

投标总价(小写): 137568477.08元

(大写): 壹亿叁仟柒佰伍拾陆万捌仟肆佰柒拾柒元零角捌分

投标人: _____


法定代表人

或其授权人: _____

(签字或盖章)

编制人: _____

时 间:



中标人的投标文件主要内容一览表

结构类型	/	建筑面积(M ²)	/	项目经理	艾相仁 鄂 142171725478
工程内容及范围	详见施工图纸和业主方委托的内容				
中标价(万元)	13756.847708		预算价(万元)	14481.13	
中标工期	540 日历天		招标文件要求工期	540 日历天	
投标文件质量等级	合格		招标文件要求质量等级	合格	
钢材(T)			标底数		
水泥(T)			标底数		
中粗砂(m ³)			标底数		

中标结果备案表

阳新县公共资源交易监督管理局备案意见:



2020年09月10日

说明: 1、本通知一式六份, 复印无效。

2、本通知书未经阳新县公共资源交易监督管理局盖章无效。

3091

建设工程招标代理合同

中华人民共和国建设部
国家工商行政管理总局
制定

阳新县政府采购计划备案表

阳财采计备[2020] 87 号 填报日期: 2020年7月20日

采购单位(公章)		阳新县住房和城乡建设局		业务科室	工程部				
采购单位经办人		黄杰	联系方式(移动、固定电话)	15972533012	E-mail				
一	项目(设备)名称	阳新县老城区雨污分流一期工程(截污干管)		项目分类(勾选"√") 1.工程类(√) 2.货物类() 3.服务类()					
	项目联系人	黄杰	联系方式(移动或固定电话)	15972533012					
二	政府采购项目资金来源								
	采购资金总额合计(元)	14481.13万	预算资金总额小计(元)						
			其他资金总额小计(元)	14481.13万					
三	政府采购组织形式(勾选"√")	1.政府集中采购() 2.部门集中采购() 3.自行组织采购() 4.委托代理采购(√)			采购代理机构 湖北中靖工程咨询有限公司				
	政府采购方式(勾选"√")	1.公开招标(√) 2.邀请招标() 3.竞争性谈判() 4.竞争性磋商() 5.询价() 6.单一来源()							
四	采购项目需求								
		采购项目名称	采购数量	计量单位	参考单价(元)	采购金额(元)	是否进口	节能	环保
	采购明细	阳新县老城区雨污分流一期工程(截污干管)				14481.13万			
	采购金额合计(元)					壹亿肆仟肆佰捌拾壹万叁仟叁佰叁拾叁元整(¥14481.13万元)			
备注	 2020.8.7								

交易告知备案表

项目编号: 0166-Zgc·2020-73


项目名称: 阳新县老城区雨污分流一期工程(截污干管)

招标范围: 勘察 ☐ 设计 ☐ 施工 ☒监理 ☐ 货物 ☐

招标单位: 阳新县住房和城乡建设局



代理机构: 湖北中靖工程咨询有限公司



张绪平印

股室意见:

(签字)



分管领导:

(签字)

阳新县公共资源交易中心

阳新县工程项目交易告知备案表

工程项目名称		阳新县老城区雨污分流一期工程(截污干管)	
建设地点		阳新县老城区	
项目业主		阳新县住房和城乡建设局	
项目 招标人	招标人名称	阳新县住房和城乡建设局	
	办公地址	阳新县陵园大道13号	
	招标联系人	姓名: 黄杰 联系电话: 15972533012	
项目总投资概算		14481.13 万元	
项目资金来源落实及到位情况		已落实	
本次招标范围		勘察 ☐ 设计 ☐ 施工 ☒ 监理 ☐ 货物 ☐ 代理 ☐	
本次招标方式		公开招标 ☒ (评定分离 ☒ 资格预审 ☐ 其他 ☐) 邀请招标 ☐ 方案征集 ☐	
本次招标内容		①截污干管②恩波堤街合流管出口改造③锦富路合流管出口改造④湖滨路污水干管(俞家湾路至环湖西路)⑤兴国大道(东坡路至图书馆)雨水管网⑥兴国大道(桥头至污水处理厂)污水管等	
本次招标标段划分		/	
本次招标标的金额(万元)		14481.13 万元	
拟定招标时间		2020 年 7 月	
拟定投标资质及等级要求		市政工程施工总承包贰级及以上资质	
拟定项目负责人资格要求		市政专业贰级或贰级以上(不含临时证)注册建造师执业资格	
代理 机构	选择方式	公开遴选 ☐ 直接委托 ☒	
	项目负责人	姓名: 万格 执业资格: 联系电话: 0714-7398188	
项目 工程 造价 咨询 单位	委托造价咨询服务内容		
	造价咨询资质证书编号		
	本项目造价咨询负责人	姓名: 联系电话: 证书编号:	

一、投标函及投标函附录

(一) 投标函

阳新县住房和城乡建设局(招标人名称):

1. 我方已仔细研究了阳新县老城区雨污分流一期工程(截污干管)(项目名称)招标文件的全部内容,愿意以人民币(大写)壹亿叁仟柒佰伍拾陆万捌仟肆佰柒拾柒元零捌分(¥137568477.08元)的投标总报价,工期18个月,按合同约定实施和完成承包工程,修补工程中的任何缺陷,工程质量达到国家现行工程质量验收合格标准。

在我方的上述投标总报价中,包括:安全文明施工费¥:3842193.65元;暂列金额¥:11000000元;专业工程暂估价¥:3100000元。

2. 我方拟派的项目经理:艾相仁(姓名),注册执业证书号码:鄂142171725478。

3. 我方承诺在投标有效期60天内不修改、撤销投标文件。

4. 随同本投标函提交投标保证金一份,金额为人民币(大写)伍拾万元(¥:500000.00元)。

5. 如我方中标:

(1) 我方承诺在收到中标通知书后,在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2) 随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3) 我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

(4) 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

6. 我方在此声明,所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确,且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

7. / (其他补充说明)。

投标人:阳新县市政工程公司(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人:郑芸(签字)

地址:湖北省黄石市阳新县兴国镇林峰街盛世华庭5楼

网址: /

电话: 0714-7323249

传真: 0714-7323249

邮政编码: 435200

2020年9月2日

(二) 投标函附录

工程名称: 阳新县老城区雨污分流一期工程(截污干管)

序号	条款内容	合同条款号	约定内容	备注
1	项目经理		(见投标函)	
2	工期	1.21	(见投标函)	
3	缺陷责任期	61.2	质量缺陷责任期: 二十四个月	
4	承包人履约担保金额	23.1	中标价的 10%	
5	分包	1.11	不分包	
6	逾期竣工违约金	54.2	每误期一天处罚 3000 元	
7	逾期竣工违约金最高限额	54.2	最高限额为: 工程结算价的 6%	
8	质量标准	36.1	达到国家现行施工验收规范合格标准。	
9	价格调整的差额计算	55.2	遵守专用合同条款第 55.2 款规定	
10	预付款额度	58.1	/	
11	预付款保函金额	58.1.1	/	
12	质量保证金扣留百分比	61.3.3	按照通用条款的约定, 从每次应支付给承包人的工程款(包括进度款和结算款)中扣留, 扣留的比例为 5%。	
13	质量保证金额度	61.3.3	工程价款结算总额的 5%	
14	权利义务		符合第四章“合同条款及格式”规定	
15	技术标准和要求		符合第七章“技术标准和要求”规定	
备注: 投标人在响应招标文件中规定的实质要求和条件的基础上, 可作出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。				

投标人: 阳新县市政工程有限公司 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: 朱子强 (签字)



2020 年 9 月 2 日

工程项目投标报价汇总表

序号		费用名称	相同个数	金额
1		阳新县老城区雨污分流一期工程（截污干管）	1	137568477.08
1.1		西截污干管	1	106115212.80
1.2		东截污干管	1	1745072.43
1.3		恩波堤街合流管出口改造	1	3470868.25
1.4		锦福路合流管出口改造	1	1207637.37
1.5		湖滨路	1	2685489.54
1.6		兴国大道	1	3533523.95
1.7		兴国大道（桥头至污水厂）	1	6421653.93
1.8		雨污分流改造一期（泵站、调蓄池）—电气设备	1	1389018.81
1.9		暂列金		11000000.00
合计				137568477.08

工程投标报价汇总表

工程名称: 阳新县老城区雨污分流改造一期工程(截污干管)

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	西截污干管	106115212.80	2200000.00	3366694.46	6356339.72
2	东截污干管	1745072.43	0.00	34134.69	69851.13
3	慈波堤侧合流管出口改造	3470868.25	900000.00	49192.34	96437.00
4	锦福路合流管出口改造	1207637.37	0.00	42298.84	83798.46
5	湖滨路	2685489.54	0.00	84073.77	167209.83
6	兴国大道	3533523.95	0.00	55874.25	113369.68
7	兴国大道(桥头至污水厂)	6421653.93	0.00	204987.01	413808.92
8	雨污分流改造一期(泵站、调蓄池)一电气设备	1389018.81	0.00	4938.29	6364.68
9	暂列金		0.00	0.00	0.00
	合计	107568477.08	2100000.00	3842193.65	7307179.50
	建设项目数据				
	人工费	7679489.48			
	材料费	38904915.95			
	机械费	33960586.37			
	费用	25492689.61			
	主材费	7493143.41			
	设备	0.00			
	增值税	9937652.38			

阳新县建设工程施工

中标通知书

阳新县公共资源交易监督管理局制

阳新县市政工程公司：

自2020年09月03日开标后，经评标委员会评定并报阳新县公共资源交易监督管理局备案，确定阳新县老城区雨污分流一期工程(截污干管)项目(项目编号：0166-Zgc·2020-73)由你单位中标人。

中标人收到中标通知书后，请按招标文件要求，在30日内与阳新县住房和城乡建设局洽谈并签订商务合同，并同时报招标管理机构备案。在期限内不来草拟合同者作放弃中标处理。

招标人(盖章)：



法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：2020年09月 日



中标人的投标文件主要内容一览表

结 构 类 型	/	建筑面积 (M ²)	/	项目 经理	艾相仁 鄂 142171725478
承包工程的 项目及范围	详见施工图纸和业主方委托的内容				
中标价 (万元)	13756.847708		预算价 (万元)	14481.13	
中标工期	540 日历天		招标文件要求工期	540 日历天	
投标文件质量等级	合格		招标文件要求质量等级	合格	
三 材 用 量	钢 材 (T)		标底数		
	水 泥 (T)		标底数		
	中粗砂 (m ³)		标底数		

中标结果备案表

阳新县公共资源交易监督管理局备案意见：



2020 年 09 月 10 日

说明：1、本通知一式六份，复印无效。

2、本通知书未经阳新县公共资源交易监督管理局盖章无效。

第一章 招标公告

阳新县老城区雨污分流一期工程（截污干管）施工招标公告

招标编号：131-2020GC-72

1. 招标条件

本招标项目阳新县老城区雨污分流一期工程（截污干管）已由阳新县住房和城乡建设局以阳财采计备【2020】B107号文批准建设，建设资金来自财政资金，招标人为阳新县住房和城乡建设局，招标代理机构为湖北中靖工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 本招标项目的建设地点：阳新县老城区

2.2 本招标项目的建设内容：①截污干管②恩波堤街合流管出口改造③锦富路合流管出口改造④湖滨路污水干管(俞家湾路至环湖西路)⑤兴国大道(东坡路至图书馆)雨水管网⑥兴国大道(桥头至污水处理厂)污水管等。具体招标内容详见图纸及工程清单

2.3 本招标项目的合同估算价：约 14481.13 万元。

2.4 本招标项目的计划工期：18 个月，计划开工日期 2020 年 9 月

2.5 本招标项目的招标范围：详见图纸及招标工程量清单。

2.6 本招标项目的标段划分（如果有）：本项目划分为 1 个标段。

2.7 其他：质量目标：达到国家现行工程质量验收合格标准。

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备住房和城乡建设主管部门颁发的有效的市政工程施工承包贰级及以上资质，具备有效的安全生产许可证，具备工商行政管理部门核发的有

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在黄石公共资源交易信息网、阳新县人民政府网上发布。

7. 联系方式

1. 招标人：阳新县住房和城乡建设局

地址：阳新县陵园大道 13 号

联系人：黄杰 电话：15972533012

2. 招标代理机构：湖北中靖工程咨询有限公司

地址：阳新县宏维·华仁北郡 11 栋 33 楼 3308 室

联系人：万格 电话：0714-7398188

3. 综合监督机构：政务服务和大数据管理局公共资源交易监督管理股

联系电话：0714-7319782

地址：阳新县市民之家 4 楼

2020 年 8 月

备注：投标人拟派的项目经理（建造师）（下同）不得同时担任两个及以上工程项目的经理（项目负责人）。存在下列情形之一的，视为未担任其他在施工程项目的经理：（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的；（2）合同约定的工期合格的；（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过 120 天（含），经建设单位同意的。

政务公开 > 信息公开目录 > 采购招标 > 中标结果公告

阳新县老城区雨污分流一期工程（截污干管）项目定标结果公告

项目编号: 000014349yx_zj/2020-00059

发布日期: 2020-09-08

发布机构: 县公共资源交易中心

号: 无

文件分类: 城乡建设、环境保护

所属机构: 县住建局

阳新县老城区雨污分流一期工程（截污干管）项目定标结果公告

招标项目编号: 131-2020GC- 72

项目于2020年9月3日在黄石公共资源交易信息网、阳新县人民政府网上发布了中标候选人公示,公示期为2020年9月3日至2020年9月7日17时。现对本次招标的定标结果公告如下:

中标人	中标价(万元)	项目经理
阳新市政工程公司	13756.847708	艾相仁

公示内容以阳新人民政府网为准

1.招标人: 阳新县住房和城乡建设局

地址: 阳新县陆路大道13号

联系人: 黄杰

电话: 15972533012

2.招标代理机构: 湖北中锦工程咨询有限公司

地址: 阳新县宏维·华仁北郡11栋33楼3308室

联系人: 万楠 电话: 0714-7398188

3.综合监督机构: 政务服务和大数据管理局公共资源交易监督管理局

联系电话: 0714-7319782

地址: 阳新县市民之家4楼

20:

阳新县老城区雨污分流一期工程(截污干管)

施
工
合
同

发包人：阳新县住房和城乡建设局

承包人：阳新县市政工程公司

二〇二〇年九月

第一部分 协议书

发包人：(全称) 阳新县住房和城乡建设局承包人：(全称) 阳新县市政工程公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工有关事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：阳新县老城区雨污分流一期工程(截污干管)工程地点：阳新县老城区

工程规模：①截污干管②思波堤街合流管出口改造③锦富路合流管出口改造④湖滨路污水干管(俞家湾路至环湖西路)⑤兴园大道(东城路至图书馆)雨水管网⑥兴园大道(桥头至污水处理厂)污水管等。

工程立项批准或核准、备案文号：阳财采计备【2020】B107号文资金来源：财政资金

二、工程承包范围

详见本项目施工图纸及工程量清单全部内容。

三、合同工期

开工日期：2020 年 9 月(具体开工日期以发包人下达的开工时间为准)竣工日期：2022 年 3 月合同工期总日历天数：550 日 天。

四、工程质量

工程质量标准：合格

五、合同价款

合同价款：

(大写)：壹亿叁仟柒佰伍拾陆万捌仟肆佰柒拾柒圆零捌分；

(小写)：137568477.08 元。

其中：安全防护、文明施工措施费：

(大写)： 元；

(小写)： 元。

其它约定： 。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件与本合同第二部分通用条款和第三部分专用条款的第 2.1 款赋予的规定一致。

七、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。

九、合同生效

本合同订立时间： 年 月 日

本合同订立地点： 湖北省黄石市阳新县

双方约定本合同自 双方签字盖章后 生效。

十、合同备案

本合同生效后必须送 备案。

发包人：(公章) 阳新县住房和城乡建设局

法定代表人：

委托代理人：

承包人：(公章) 阳新县市政工程有限公司

法定代表人：

委托代理人：

竣工报告

A13

竣工验收证书


工程编号：_____

工程名称：_____阳新县乡镇污水处理厂及配套管网工程
PPP项目配套管网工程


施工单位：_____中船重工环境工程有限公司阳新县市政工程有限公司

资质等级证书号：_____4202220000848

参加竣工验收单位意见			
建设单位	行政要求  项目负责人 (盖章)	设计单位	 项目负责人 (盖章)
监理单位	 项目负责人 (盖章)	监理单位	验收通过  总监工程师 (盖章) 2020.6.25
施工单位	行政要求  项目负责人 (盖章)		
竣工验收时间		2020年12月16日	

工程质量自评结论			
项目符合设计及施工规范要求。 项目质量：合格。			
参加竣工验收单位意见			
建设单位	 项目负责人：[Signature] (盖章)	设计单位	 同意竣工验收 意见：[Signature] 项目负责人：[Signature] (盖章)
监理单位	符合有关技术规范和标准，同意竣工验收  项目负责人：[Signature] (盖章)	监理单位	 同意竣工验收 意见：[Signature] 总监理工程师：[Signature] (盖章)
施工单位	 项目负责人：[Signature] (盖章)	设施管理单位	 管理负责人：[Signature] (盖章)
竣工验收时间		年 月 日	

参加竣工验收单位意见	
设计单位 阳新县住房和城乡建设局 项目负责人: [Signature] (盖章)	监理单位 阳新县住房和城乡建设局 项目负责人: [Signature] (盖章)
勘察单位 阳新县住房和城乡建设局 项目负责人: [Signature] (盖章)	施工单位 阳新县市政工程有限公司 项目负责人: [Signature] 2020.6.5
建设单位 阳新县市政工程有限公司 项目负责人: [Signature] (盖章)	阳新县市政工程有限公司 项目负责人: [Signature] (盖章)
竣工验收时间	2020年7月6日

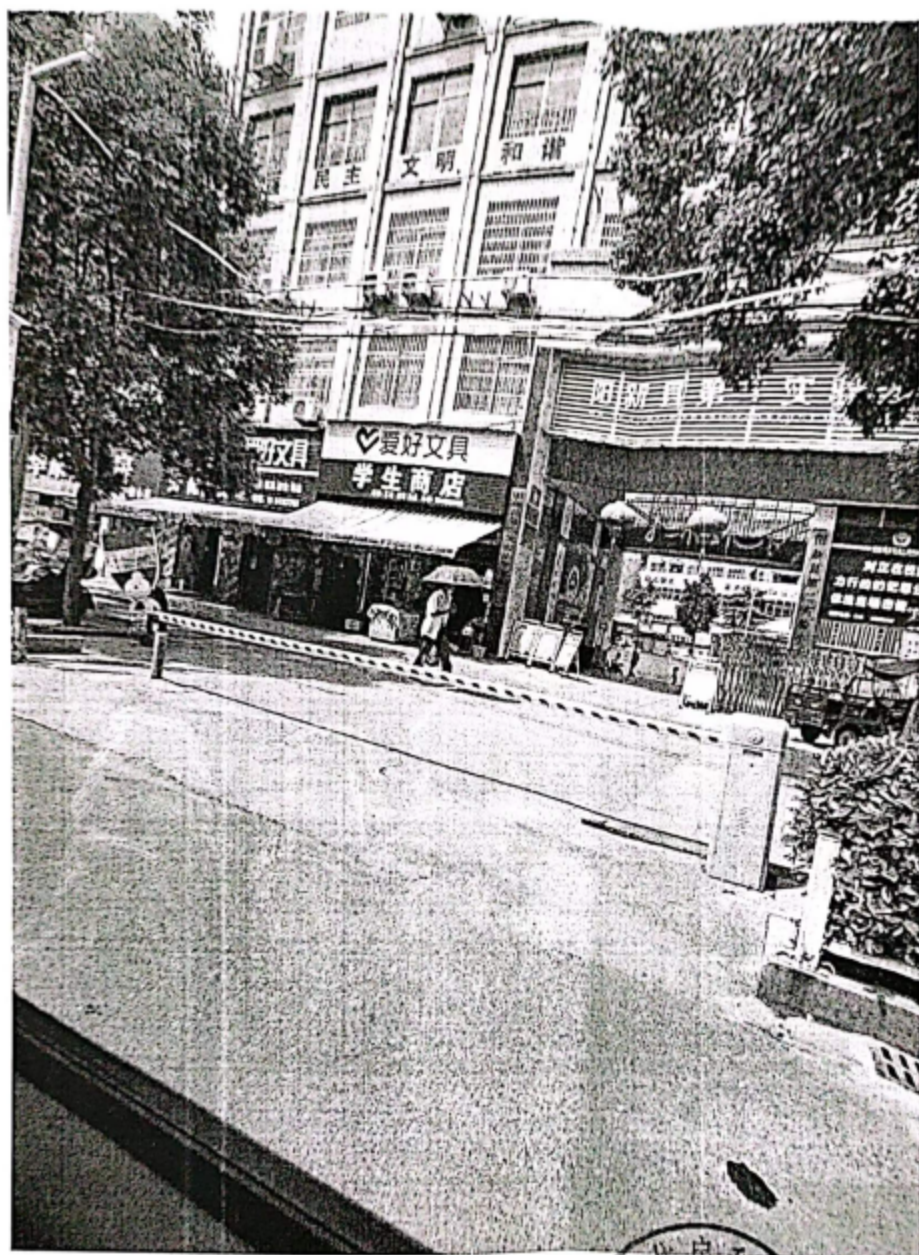



页码: 1/1



营业执照

(副本) (1-1)

统一社会信用代码 914202224222203379

名称 阳新县市政工程公司
 类型 全民所有制
 住所 湖北省黄石市阳新县兴国镇林峰街盛世华庭五楼
 法定代表人 柯俊
 注册资金 贰仟万圆整
 成立日期 1991年11月22日
 经营期限 长期

经营范围 园林绿化; 房屋租赁; 高度50米以下的工业、民用建筑工程; 高度70米以下的构筑物工程; 建筑面积1.2万平方米以下的单位工业、民用建筑工程; 单跨跨度27米以下的建筑工程; 各类城市道路; 单跨45米以下的城市桥梁; 15万吨/日以下的供水工程; 10万吨/日以下的污水处理工程; 25万吨/日以下的给水工程; 15万吨/日以下的污水泵站、雨水泵站; 各类给排水及中水管道工程; 中压以下燃气管道、调压站; 供热面积150万平方米以下热力工程和各类热力管道工程; 各类城市生活垃圾处理工程; 各类城市广场、地面停车场硬质铺装; 单项合同额4000万元以下的市政综合工程; 非开挖管道工程施工; 建筑装饰装修工程; 地基基础工程、钢结构工程。(涉及许可经营项目, 应取得相关部门许可后方可经营)



登记机关

注册分展公示
 每年6月30日前申报年
 报。否则列入异常名录。

2018年 03月 21日

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制 2018/3/21

企业信用信息公示系统网址: <http://bh.nect.gov.cn>
<http://192.0.99.221/Topicis/CertificatePrint.do>
